

工事についてのお知らせ

三谷地区ため池改修通信 1月号

施工者: 吉田建設(株)

三谷地区地域ため池(追作堤)改修工事

『三谷地区の皆様、新年あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。』
追作堤の改修工事は予定より少し先行しながら現場作業を進めております。1月4日に宇倍神社での祈祷後、作業を再開いたしました。現在は、洪水吐きの残り2スパンの埋戻し作業をおこなっております。今後、洪水吐きの上に橋(コンクリート製品)を架け、法面整形後に残りのブロックマット(堤内の波による浸食防止の為)を設置し、転落防止柵・擬木階段(追加指示)等の設置作業を進め、場内の最終整備に入っていきます。1月末を目途に本作業を終了させ、片付け作業を2月上旬に終わる予定です。12月末で90%の進捗ですので、残り10%の作業を無事故で、品質を確保しながら進めていきたいと考えております。残り1か月半、関係者一同力を合わせてがんばってまいりますので、引き続き工事へのご理解とご協力をお願いいたします。雪により足元が滑りやすい為、安全運転と転倒・スリップ災害防止に努めていきたいと考えております。皆様も降雪時、また凍結時には十分足元に気をつけて、怪我のないようにお過ごしください。

工事場所: 鳥取市河原町三谷地内
工期: 平成 27年 3月 26日 ~ 平成 28年 1月 5日 **【変更2月15日】**

発注者: 鳥取県東部農林事務所 TE10857-20-3571
連絡先: 地域整備課 総合整備担当 FAX 0857-37-1283
担当者: 日野 浩二(主任監督員) 田中 彰(一般監督員)

施工者: 吉田建設株式会社
連絡先: 住所 鳥取市 国府町 広西 226番地
TEL 0857-24-9748
FAX 0857-29-4940
現場代理人: 川上 啓志 主任技術者: 大谷 経行

工事内容


ため池改修 1式 各月の主な作業予定

- 1 堤体工
- 2 洪水吐工
- 3 取水施設工
- 4 付帯工
- 5 仮設工

4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月
準備工	堤仮設工	仮付堤工	取水堤工	取水堤工	取水付堤工	取水付堤工	洪水吐堤工	洪水吐堤工	洪水吐付堤工	後片付け

構造物の寸法を確認しているところです。

自社検査 → 発注者監督員による立会実施

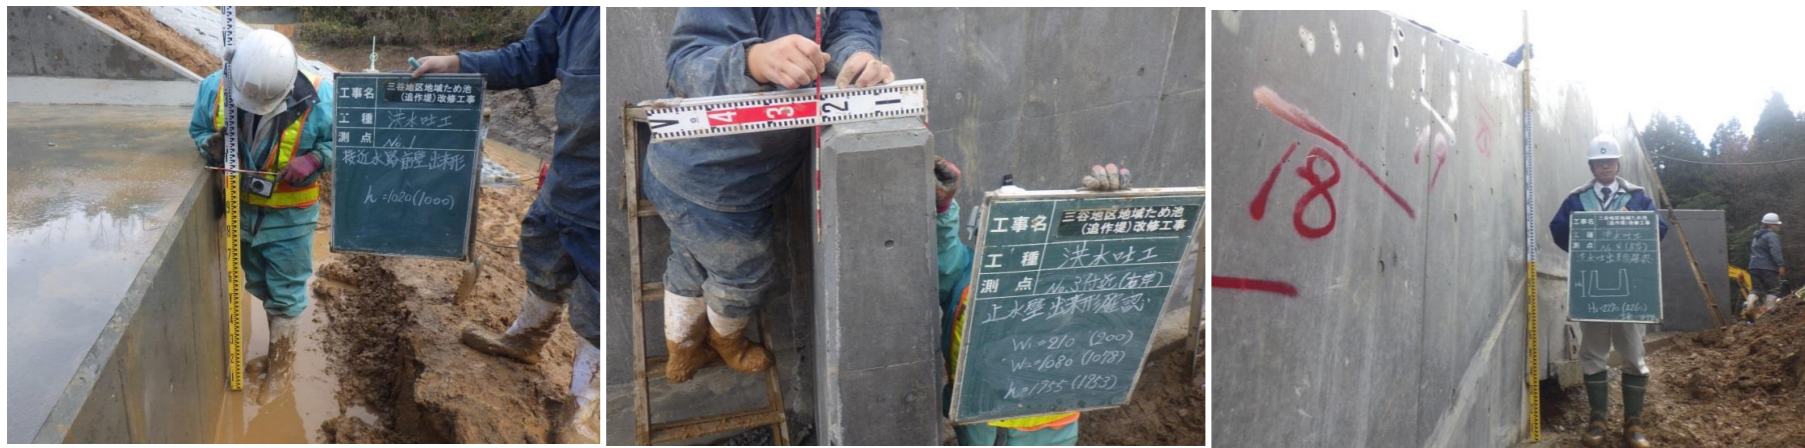

1月4日 宇倍神社にて →



12月28日PM1:00の様子です。



丙申年(ひのえさるどし)。陽がふりそそぐ年だそうです。本年も、ありがとうございます。上をめぐります。
